ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	№ по ред	Вид СМР	Ед-ца	К-во	Продълж. /дни/	Начало	Край	Вид монтажни раб. звено	Брой раб.	Ръководен състав	Механизация
1		Обособена позиция № 2 Обект: Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметство на с.Дружба в УПИ VIII на.19 по плана на с.Сушина общ.Черни Връх			44 дни	Mon 1.6.20	Tue 14.7.20				
2	I.	I. Подготвителен етап			3 дни	Mon 1.6.20	Wed 3.6.20				
3	1	Подписване на Акт Образец 2а и откриване на строителната площадка			1 ден	Mon 1.6.20	Mon 1.6.20			РСО, ТР, КБЗ	
4	2	Подготвителни работи, организация и мобилизация на строителната площадка			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	
5	3	Доставка и складиране на строителните материали			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			РСО, ТР, ЕКК, КБЗ	Бордова кола-2бр
6	II.	II. Основен (строителен) етап			40 дни	Thu 4.6.20	Mon 13.7.20			РСО	
7	A	Мерки за енергоспестяване по "Ремонт покрив"			40 дни	Thu 4.6.20	Mon 13.7.20			РСО	Бордова кола -2бр , автокран-1бр
8	1	Демонтаж на капаци с радене	м	39.60	1 ден	Thu 4.6.20	Thu 4.6.20	Дърводелец, общи работници	3	ТР, КБЗ	
9	2	Демонтаж на керемиди с радене	м2	220.00	3 дни	Thu 4.6.20	Sat 6.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ	
10	3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	11.60	1 ден	Sat 6.6.20	Sat 6.6.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ	
11	4	Демонтаж на улук	м	53.50	1 ден	Sun 7.6.20	Sun 7.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ	
12	5	Демонтаж на улама	м	7.00	1 ден	Sat 6.6.20	Sat 6.6.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ	
13	6	Демонтаж на летви	м2	220.00	2 дни	Mon 8.6.20	Tue 9.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ	
14	7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	220.00	3 дни	Mon 8.6.20	Wed 10.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ	
15	8	Доставка и полагане на OSB 21мм влагоустойчиво	м2	150.00	2 дни	Fri 12.6.20	Sat 13.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-1
16	9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегниране /подмяна на ребра/	м3	1.50	2 дни	Sun 14.6.20	Mon 15.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-2, перфоратор -2
17	10	Доставка и полагане на пазмерни вкл.импрегниране и лакиране	м2	48.00	2 дни	Thu 18.6.20	Fri 19.6.20	Дърводелец	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-1
18	11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	53.50	2 дни	Mon 29.6.20	Tue 30.6.20	Дърводелец	3	ТР, КБЗ, ЕКК	такер-1
19	12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегниране	м2	220.00	3 дни	Tue 16.6.20	Thu 18.6.20	Дърводелец, бояджия, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-3, циркуляр-2, вана за импрегниране-1
20	13	Доставка и полагане на рулонна хидроизолация без посипка	м2	220.00	2 дни	Tue 23.6.20	Wed 24.6.20	Изолировчик, общ работник	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Газова горелка-2бр
21	14	Направа на безшевен улук	м	53.50	2 дни	Sun 21.6.20	Mon 22.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, к-т за монтаж-2, перфоратор-1
22	15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	8.00	1 ден	Sun 21.6.20	Sun 21.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, к-т за монтаж-2
23	16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	64.00	2 дни	Sun 12.7.20	Mon 13.7.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, ъглошлайф-1, к-т за монтаж-2
24	17	Доставка и монтаж на летви по наклона	м2	330.00	2 дни	Thu 25.6.20	Fri 26.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
25	18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на наклона	м2	660.00	4 дни	Sat 27.6.20	Tue 30.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-5, циркуляр-1
26	19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг. 65см	м	7.00	1 ден	Thu 18.6.20	Thu 18.6.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф, абкант
27	20	Доставка и полагане на покривни керемиди - процето 50%нови	м2	220.00	3 дни	Wed 1.7.20	Fri 3.7.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
28	21	Доставка и полагане на покривни капаци - процето 50%нови	м	39.60	1 ден	Sat 4.7.20	Sat 4.7.20	Дърводелец, общи работници	3	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4,
29	22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	11.60	1 ден	Sat 20.6.20	Sat 20.6.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, абкант-1
30	23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6.00	1 ден	Fri 3.7.20	Fri 3.7.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, абкант-1
31	24	Премахване на съществуваща замазка	м2	6.00	1 ден	Thu 11.6.20	Thu 11.6.20	общи работници	2	ТР, КБЗ	къртач-1
32	25	Направа на ламаринена обшивка по козирки	м2	6.00	1 ден	Sun 21.6.20	Sun 21.6.20	Тенекеджия, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, абкант-1
33	Б	Мерки за енергоспестяване "Топлоизолация на подпокривно ниво"			3 дни	Thu 11.6.20	Sat 13.6.20			РСО	Бордова кола -1бр , самосвал -1бр
34	1	Доставка и полагане на вата 12см на дюшеме	м2	160.00	2 дни	Thu 11.6.20	Fri 12.6.20	Работник ТИ	4	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор -2бр
35	2	Направа на топлоизолация XPS 10см по козирки	м2	8.00	1 ден	Fri 12.6.20	Fri 12.6.20	Работник ТИ	3	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
36	3	Направа на армирана замазка	м2	6.00	1 ден	Sat 13.6.20	Sat 13.6.20	Замазвачи	2	ТР, КБЗ, ЕКК	бетонобъркачка-1
37	В	Мерки за енергоспестяване "Подмяна на дограма"			7 дни	Tue 16.6.20	Mon 22.6.20			РСО	Бордова кола със стойки за дограма-1
38	1	Подмяна на стара дограма по спецификация	м2	4.84	1 ден	Tue 16.6.20	Tue 16.6.20	Дограмаджии	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-3, перфоратор-1
39	2	Обработване на страници с гипсокартон на лепило вкл.впускане с ъглозащитен профил и шпакловка	м	21.50	1 ден	Wed 17.6.20	Wed 17.6.20	Работник сухо строителство	3	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструменти за ГК-1, миксер-1
40	3	Шпакловка по стени	м2	15.00	1 ден	Thu 18.6.20	Thu 18.6.20	гипсаджии	1	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
41	4	Боядисване с латекс	м2	15.00	1 ден	Mon 22.6.20	Mon 22.6.20	бояджии	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
42	Г	Мерки за енергоспестяване "Изпълнение на топлоизолационна система на външни ограждащи елементи - фасадни стени"			22 дни	Tue 23.6.20	Sun 12.7.20			РСО	Бордова кола 2бр
43	1	Направа на топлоизолация XPS 10см по цокъл	м2	29.60	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Работник ТИ	2	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-2, миксер-1
44	2	Направа на топлоизолация EPS 10см по стени	м2	435.00	4 дни	Tue 23.6.20	Fri 26.6.20	Работник ТИ, общ работник	3	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-4, миксер-2,
45	3	Обръщане на отвори с XPS 2см с шир 20см	м	392.00	3 дни	Thu 25.6.20	Sat 27.6.20	Работник ТИ, общ работник	3	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-2, миксер-1
46	4	Доставка и монтаж на ъгъл с мрежа	м	250.00	2 дни	Sun 28.6.20	Mon 29.6.20	Работник ТИ	3	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
47	5	Направа на циментова шпакловка с PVC мрежа	м2	502.50	5 дни	Tue 30.6.20	Sat 4.7.20	Работник ТИ, общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-2
48	6	Възстановяване на корниз по фасада с елементи от полистирол	м	22.60	1 ден	Sun 28.6.20	Sun 28.6.20		2	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1, циркуляр-1,
49	7	Боядисване със силиконова боя по корниз	м	22.60	1 ден	Sat 11.7.20	Sat 11.7.20		1	ТР, КБЗ, ЕКК	
50	8	Направа на фасадна силикатна мазилка по стени и страници	м2	471.50	3 дни	Wed 8.7.20	Fri 10.7.20	Работник ТИ, общ работник	5	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-3
51	9	Направа на цокълна мозаечна мазилка	м2	30.60	1 ден	Sat 11.7.20	Sat 11.7.20	Работник ТИ, общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-2
52	10	Направа на ламаринена пола с полиестерно покритие с разг 25см	м	39.00	1 ден	Sun 12.7.20	Sun 12.7.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструменти за ламарина-1, абкант-1
53	Д	Мерки за енергоспестяване "Топлоизолация на под"			3 дни	Sat 13.6.20	Mon 15.6.20			РСО	Бордова кола 1бр
54	1	Направа на топлоизолация каменна вата 12см по таван на дюбели в сутерен	м2	145.00	3 дни	Sat 13.6.20	Mon 15.6.20	общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-3, миксер 1
55	Е	Други			33 дни	Thu 11.6.20	Mon 13.7.20				
56	1	Почистване на строителни отпадъци	м3	30.00	2 дни	Thu 11.6.20	Mon 13.7.20	общ работник	3	ТР, КБЗ	
57	2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	30.00	2 дни	Thu 11.6.20	Mon 13.7.20	общ работник	3	ТР, КБЗ	Самосвал-1
58	III	ОВОРУДВАНЕ			28 дни	Mon 8.6.20	Mon 6.7.20			РСО	бордови камион -1бр; транспортен бус-1бр
59	1	Водогрейни котел на пелети, топлинна мощност 30 kW комплект с горелка, бункер за пелети и управление	бр	1.00	9 дни	Sat 20.6.20	Sun 28.6.20	Монтажник ОВК	3	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-3; Перфоратор-1бр, ъглошлайф-1бр
60	2	Затворен мембранен разширителен съд с обем V = 35 dm3, Pmax = 0.5MPa, R 3/4"	бр	1.00	1 ден	Fri 3.7.20	Fri 3.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-1
61	3	Шрайг помпа (електронна) за гореща вода с дебит 1,8m3/h H=3mH2O	бр	1.00	1 ден	Mon 29.6.20	Mon 29.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-1
62	4	Редуцир-вентил (автоматична пълначка отоплителна инсталация) Pвх.max=10bar Pизх.max=3bar, 1/2"	бр	1.00	1 ден	Mon 29.6.20	Mon 29.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-1
63	5	Метален комин (INOX) ф 160x1мм с дължина 3м топлоизолиран с негорима минерална вата с дебелина 50мм и метален защитен кожух, 2 коляна 90 градуса	бр	1.00	2 дни	Tue 16.6.20	Wed 17.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1; винтоверт 1; перфоратор-2
64	6	Кран сферичен за вода 1"	бр	1.00	1 ден	Sat 4.7.20	Sat 4.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инстр. за ОВК-1
65	7	Изпразнителен кран 1/2"	бр	1.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инстр. за ОВК-1
66	8	Филтър за вода 1"	бр	1.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инстр. за ОВК-1
67	9	Колектор 1"	бр	1.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инстр. за ОВК-1
68	10	Тръба полиетилен PPR Ø50x6.9	м	10.00	1 ден	Mon 8.6.20	Mon 8.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т за тръби PPR-1
69	11	Тръба полиетилен PPR Ø40x6.7	м	30.00	1 ден	Mon 8.6.20	Mon 8.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т за тръби PPR-1
70	12	Тръба полиетилен PPR Ø32x5.4	м	90.00	3 дни	Tue 9.6.20	Thu 11.6.20	Монтажник ОВК	3	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т за тръби PPR-2
71	13	Петслойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка за отоплителни инсталации с температура на водата до 110ОС с диаметър 20 x 2 mm	м	30.00	1 ден	Fri 12.6.20	Fri 12.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т за тръби PPR-1
72	14	Петслойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка за отоплителни инсталации с температура на водата до 110ОС с диаметър 16 x 2 mm	м	90.00	3 дни	Sat 13.6.20	Mon 15.6.20	Монтажник ОВК	3	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т за тръби PPR-2
73	15	Топлоизолация за тръба Ø63	м	20.00	1 ден	Wed 1.7.20	Wed 1.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
74	16	Топлоизолация за тръба Ø50	м	15.00	1 ден	Wed 1.7.20	Wed 1.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
75	17	Топлоизолация за тръба Ø40	м	20.00	1 ден	Wed 1.7.20	Wed 1.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
76	18	Адаптор 16x 1/2"f	бр	34.00	3 дни	Sat 13.6.20	Mon 15.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
77	19	Скоби крепителни 50	бр	6.00	1 ден	Mon 8.6.20	Mon 8.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, винтоверт-1
78	20	Скоби крепителни 40	бр	35.00	1 ден	Mon 8.6.20	Mon 8.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, винтоверт-1
79	21	Скоби крепителни 32	бр	80.00	3 дни	Tue 9.6.20	Thu 11.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, винтоверт-1
80	22	Скоби двойни крепителни 20	бр	15.00	1 ден	Fri 12.6.20	Fri 12.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, винтоверт-1
81	23	Скоби двойни крепителни 16	бр	44.00	3 дни	Sat 13.6.20	Mon 15.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, винтоверт-1
82	24	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=600мм	бр	1.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
83	25	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=1000мм	бр	2.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
84	26	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=1200мм	бр	5.00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
85	27	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=1400мм	бр	5.00	1 ден	Wed 1.7.20	Wed 1.7.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
86	28	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=1600мм	бр	3.00	1 ден	Thu 2.7.20	Thu 2.7.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
87	29	Доставка и монтаж стоманен (панелен) радиатор Тип 22 с размери H=600мм, L=1800мм	бр	1.00	1 ден	Thu 2.7.20	Thu 2.7.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
88	30	Радиаторен вентил с термостатична глава ъглов 1/2"	бр	17.00	2 дни	Fri 3.7.20	Sat 4.7.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
89	31	Радиаторен вентил за скрит монтаж 1/2" (детентор)	бр	17.00	2 дни	Fri 3.7.20	Sat 4.7.20	Монтажник ОВК	2	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-2
90	32	Комплект 2бр тапи радиатор, 3бр щендер и конзоли	бр	17.00	1 ден	Sun 5.7.20	Sun 5.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1, перфоратор - 1
91	33	Ръчен обезвъздушител 1/2"	бр	17.00	2 дни	Sun 5.7.20	Mon 6.7.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструмент за ОВК-1
92	III.	III. Довършителен етап			7 дни	Wed 8.7.20	Tue 14.7.20			РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	
93	1	Довършителни работи и демобилизация			3 дни	Thu 9.7.20	Mon 13.7.20	общ работник	4	РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	Бордова кола, самосвал
94	2	Изготвяне на екзекутивна и друга документация за предаване на обекта			6 дни	Wed 8.7.20	Mon 13.7.20			РСО, ТР, ЕКК	
95	3	Подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа Образец 15			1 ден	Tue 14.7.20	Tue 14.7.20			РСО	

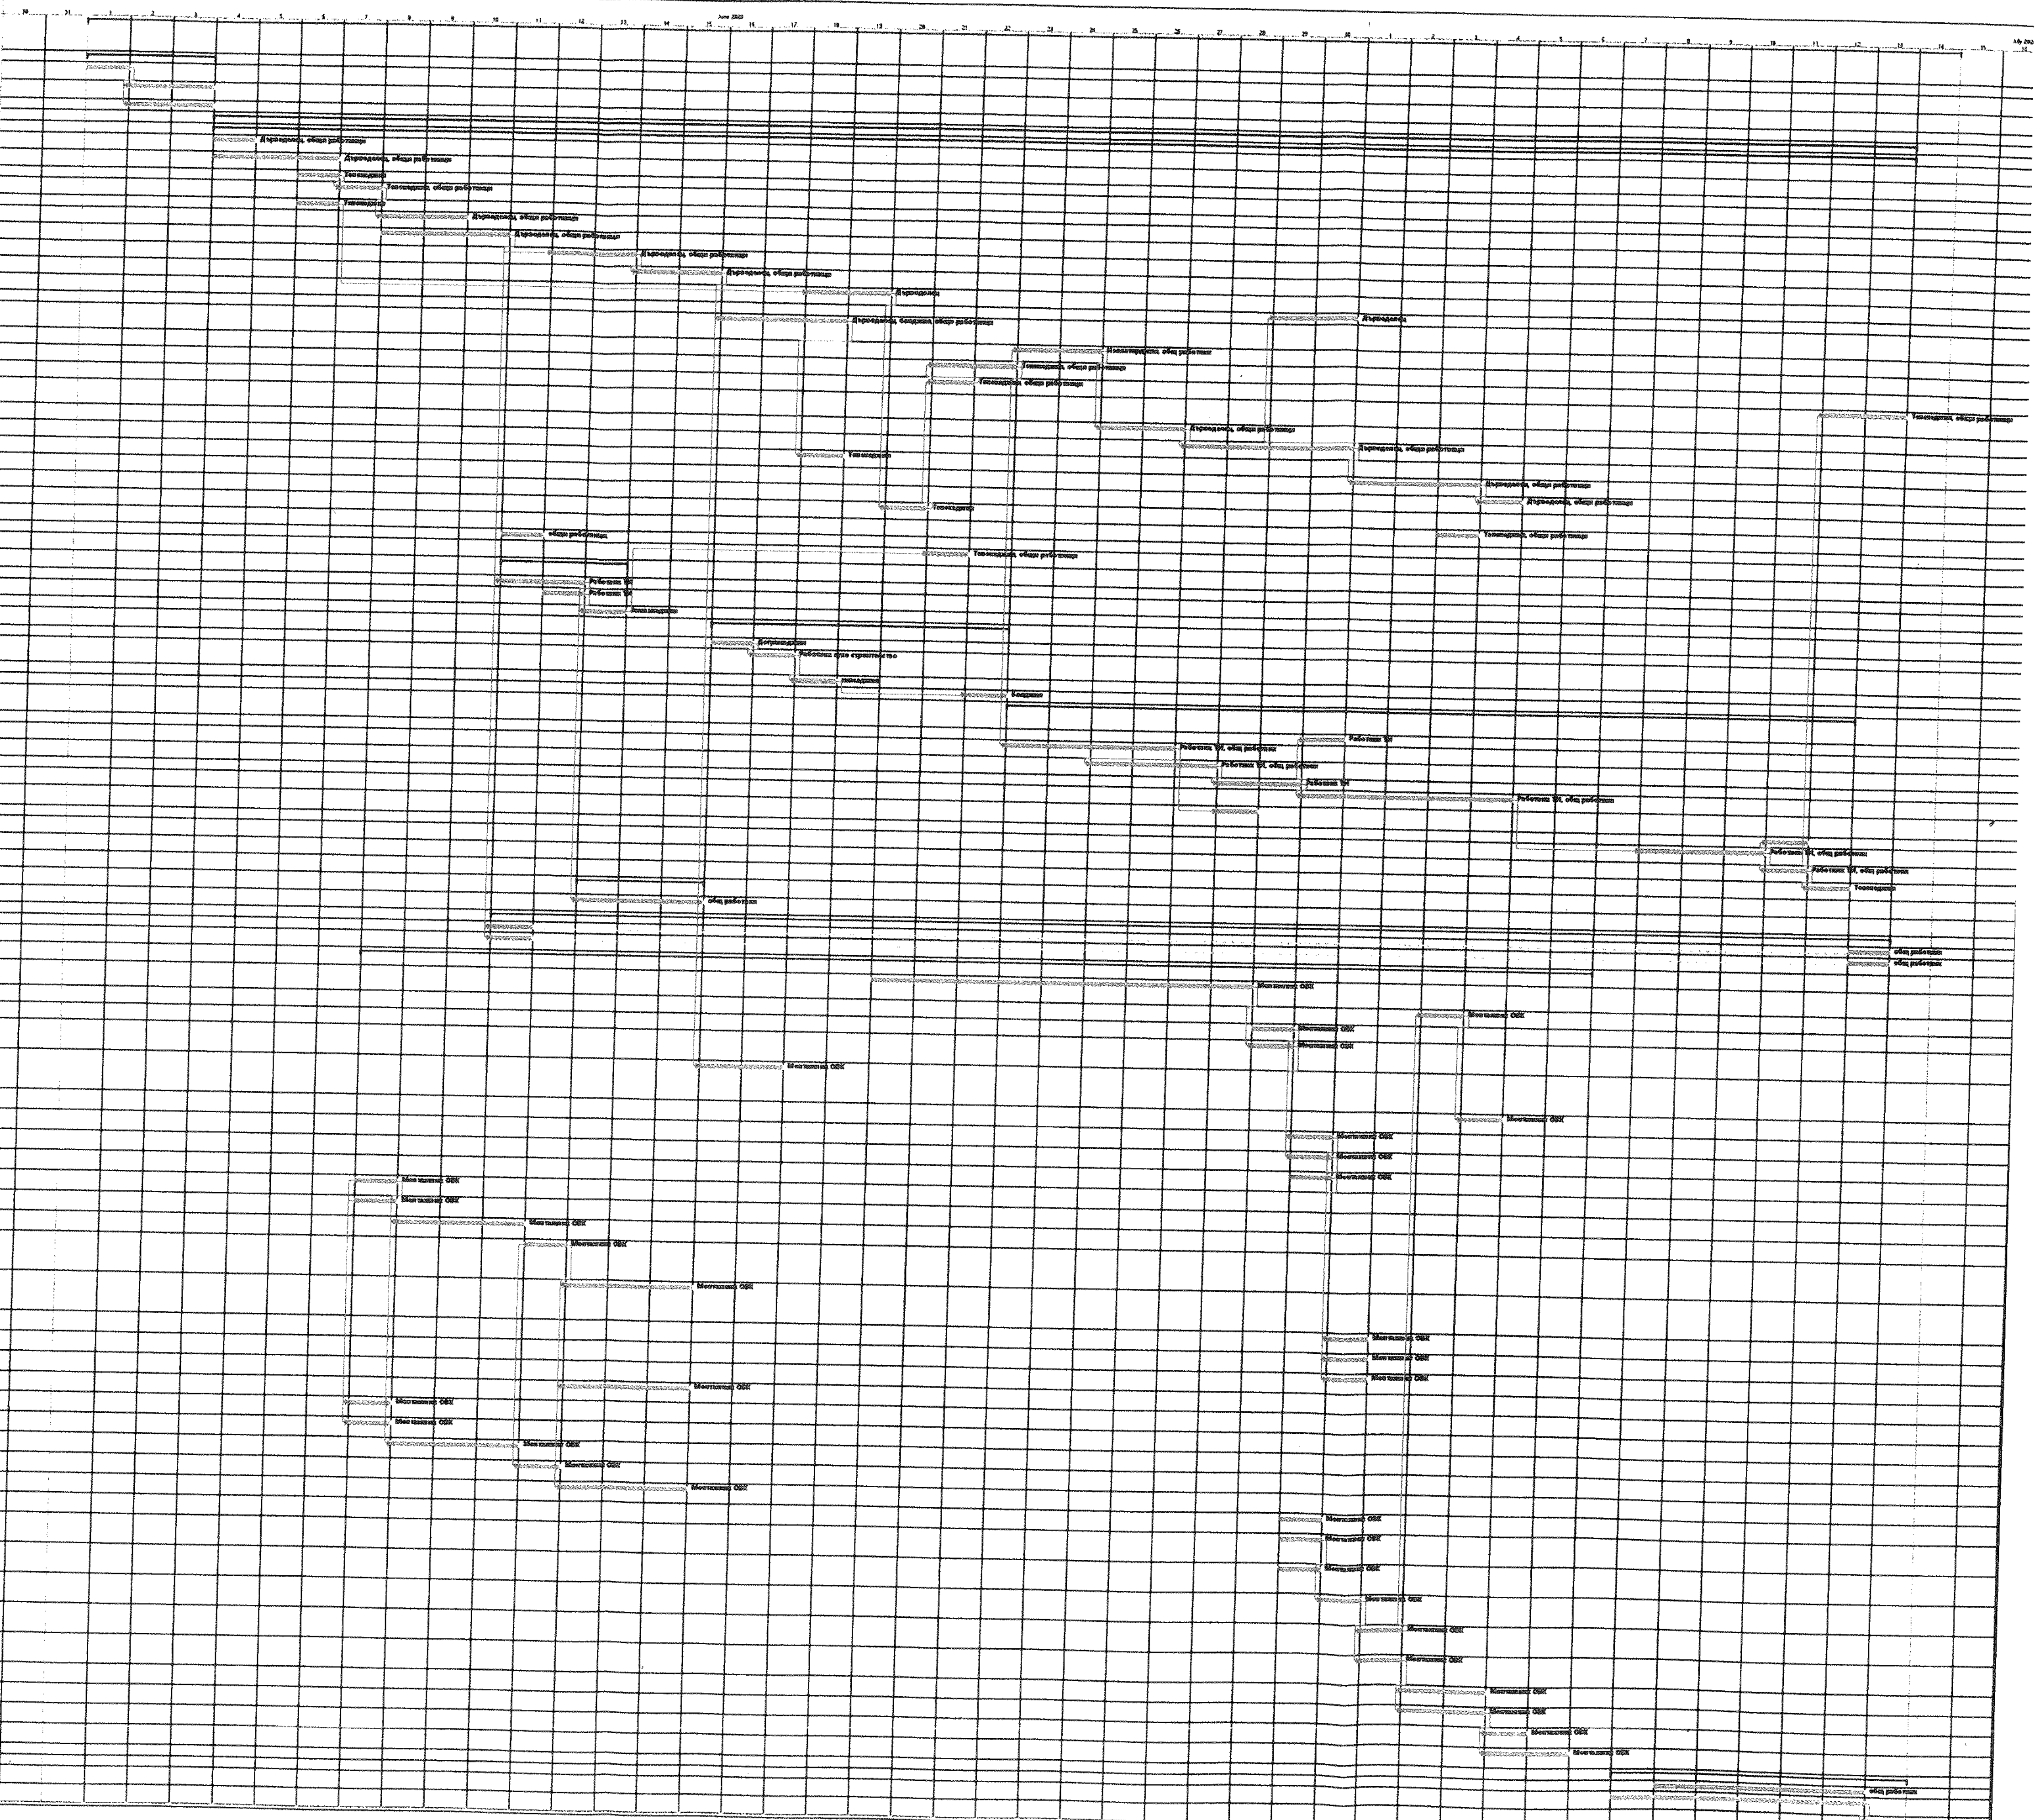

Николай Минчев.........
/Управител на "Хаус Майдин" ООД
