"Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-имоти(?), с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг" по три обособени позиции

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	номер по ред	Вид СМР	Мярка	К-во	продължителност /кал.дни/	Начало	Край	Вид монтажник, раб. Звено	Брой раб.	Ръководен състав	Механизация
1		**Обособена позиция № 3 Обект: Реконструкция,ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда - Кметство на с.Ракита в УПИ II - 723 кв.70 по плана на с.Ракита общ.Червен бряг**			**47 дни**	**Mon 1.6.20**	**Fri 17.7.20**				
2	I.	**I. Подготвителен етап**			**3 дни**	**Mon 1.6.20**	**Wed 3.6.20**				
3	1	**Подписване на Акт Образец 2а и откриване на строителната площадка**			**1 ден**	**Mon 1.6.20**	**Mon 1.6.20**			**РСО, ТР, КБЗ**	
4	2	Подготвителни работи, организация и мобилизация на строителната площадка			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	
5	3	Доставка и складиране на строителните материали			2 дни	Tue 2.6.20	Wed 3.6.20			РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	Бордова кола-2бр
6	II.	**II. Основен (строителен) етап**			**39 дни**	**Thu 4.6.20**	**Sun 12.7.20**			**РСО**	
7	А.	***Мярка за енергоспестяване"Ремонт покрив"***			***37 дни***	***Thu 4.6.20***	***Fri 10.7.20***			***РСО***	бордова кола -2бр,автокран-1бр
8	1	Демонтаж на капаци	м	69,00	2 дни	Thu 4.6.20	Fri 5.6.20	Дърводелец, общи работници	3	ТР, КБЗ	
9	2	Демонтаж на керемиди	м2	300,00	3 дни	Thu 4.6.20	Sat 6.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ	
10	3	Демонтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	7,00	1 ден	Sat 6.6.20	Sat 6.6.20	Тенекеджии	1	ТР, КБЗ	
11	4	Демонтаж на улук	м	98,00	1 ден	Sun 7.6.20	Sun 7.6.20	Тенекеджии, общи работници	2	ТР, КБЗ	
12	5	Демонтаж на улама	м	17,00	1 ден	Sat 6.6.20	Sat 6.6.20	Тенекеджии	1	ТР, КБЗ	
13	6	Демонтаж на летви	м2	300,00	2 дни	Mon 8.6.20	Tue 9.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ	
14	7	Демонтаж на носеща конструкция	м2	300,00	3 дни	Mon 8.6.20	Wed 10.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ	
15	8	Доставка и полагане на OSB 21мм влагоустойчиво	м2	175,00	2 дни	Thu 11.6.20	Fri 12.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-1
16	9	Направа на нова носеща дървена конструкция вкл.импрегниране	м3	1,50	2 дни	Sat 13.6.20	Sun 14.6.20	Дърводелец, общи работници	4	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-2,
17	10	Доставка и полагане на ламперия вкл.импрегниране и лакиране	м2	90,00	2 дни	Thu 18.6.20	Fri 19.6.20	Дърводелец	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-2, циркуляр-1
18	11	Доставка и монтаж на мрежа против птици	м	98,00	2 дни	Mon 29.6.20	Tue 30.6.20	Дърводелец	1	ТР, ЕКК, КБЗ	такер-1
19	12	Доставка и полагане на дъсчена обшивка вкл.импрегниране	м2	300,00	3 дни	Mon 15.6.20	Wed 17.6.20	Дърводелец, бояджия, общи	5	ТР, ЕКК, КБЗ	Винтоверт-3, циркуляр-2, вана за
20	13	Доставка и полагане на рулона хидроизолация без посипка	м2	300,00	2 дни	Tue 23.6.20	Wed 24.6.20	Изолатораджия, общ работник	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Газови горелки-2бр
21	14	Направа на безшевен улук	м	98,00	2 дни	Sun 21.6.20	Mon 22.6.20	Тенекеджии, общи работници	3	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, к-т за монтаж-3,
22	15	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	12,00	1 ден	Sun 21.6.20	Sun 21.6.20	Тенекеджии, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, к-т за монтаж-2
23	16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	96,00	2 дни	Thu 9.7.20	Fri 10.7.20	Тенекеджии, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, ъглошлайф-1, к-т за монтаж-2
24	17	Доставка и монтаж на летви по найлона	м2	450,00	3 дни	Wed 24.6.20	Fri 26.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
25	18	Доставка и монтаж на летви перпендикулярни на найлона	м2	900,00	4 дни	Sat 27.6.20	Tue 30.6.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-5, циркуляр-1
26	19	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка улама с разг.65см	м	17,00	1 ден	Wed 17.6.20	Wed 17.6.20	Тенекеджии	1	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, абкант-1
27	20	Доставка и монтаж на керемиди - приото 50% нови	м2	300,00	3 дни	Wed 1.7.20	Fri 3.7.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4, циркуляр-1
28	21	Доставка и монтаж на капаци - приото 50% нови	м	69,00	2 дни	Sat 4.7.20	Sun 5.7.20	Дърводелец, общи работници	5	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-4,
29	22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с разг. 45см	м	15,00	1 ден	Sat 20.6.20	Sat 20.6.20	Тенекеджии	1	ТР, КБЗ, ЕКК	ъглошлайф-1, абкант-1
30	23	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини	м2	6,00	1 ден	Fri 3.7.20	Fri 3.7.20	Тенекеджии, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК,	ъглошлайф-1, абкант-1
31	24	Премахване на съществуваща замазка	м2	12,00	1 ден	Thu 11.6.20	Thu 11.6.20	общи работници,	2	ТР, КБЗ,	къртач-1
32	25	Направа на ламаринена обшивка с поц.ламарина	м2	12,00	1 ден	Sun 21.6.20	Sun 21.6.20	Тенекеджии, общи работници	2	ТР, КБЗ, ЕКК,	ъглошлайф-1, абкант-1
33	Б	***Мярка за енергоспестяване"Топлоизолиране на подпокривна плоча"***			***4 дни***	***Wed 10.6.20***	***Sat 13.6.20***			***РСО***	бордова кола -1бр, самосвал -1бр
34	1	Доставка и полагане на вата 12см на дюшеме	м2	175,00	2 дни	Wed 10.6.20	Thu 11.6.20	Работник ТИ	4	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор -2бр
35	2	Доставка и полагане на топлоизолация XPS 100мм на лепило	м2	12,00	1 ден	Fri 12.6.20	Fri 12.6.20	Работник ТИ	1	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
36	3	Направа на армирана циментова замазка	м2	12,00	1 ден	Sat 13.6.20	Sat 13.6.20	Замазкаджии	2	ТР, КБЗ, ЕКК	бетонобъркачка-1
37	В	***Мярка за енергоспестяване"Подмяна на дограма"***			***9 дни***	***Tue 16.6.20***	***Wed 24.6.20***			***РСО***	Бордова кола със стойки за
38	1	Подмяна на стара дограма по спецификация	м2	53,03	1 ден	Tue 16.6.20	Tue 16.6.20	Дограмаджия	3	ТР, КБЗ, ЕКК	Винтоверт-3, перфоратор -1
39	2	Обръщане на страници с гипсокартон на лепило вкл.алуминиев ъглохранителен профил и шпакловка	м	110,00	3 дни	Wed 17.6.20	Fri 19.6.20	Работник сухо строителство	3	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструменти за ГК-2, миксер-1
40	3	Шпакловка по стени	м2	25,00	1 ден	Sat 20.6.20	Sat 20.6.20	гипсаджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
41	4	Боядисване с латекс	м2	25,00	1 ден	Wed 24.6.20	Wed 24.6.20	Бояджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
42	Г	***Мярка за енергоспестяване "Направа на топлоизолационна система по външни ограждащи елементи - фасадни стени"***			***18 дни***	***Tue 23.6.20***	***Fri 10.7.20***			***РСО***	Бордова кола 2бр
43	1	Направа на топлоизолация XPS 10см по цокъл	м2	64,50	2 дни	Fri 26.6.20	Sat 27.6.20	Работник ТИ	2	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-2, миксер-1
44	2	Направа на топлоизолация EPS 10см по стени	м2	312,50	4 дни	Tue 23.6.20	Fri 26.6.20	Работник ТИ, общ работник	5	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-4, миксер-2,
45	3	Обръщане на отвори с XPS 2см с шир 20см	м	170,00	3 дни	Sat 27.6.20	Mon 29.6.20	Работник ТИ, общ работник	3	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-2, миксер-1
46	4	Доставка и монтаж на ъгъл с мрежа	м	245,00	2 дни	Mon 29.6.20	Tue 30.6.20	Работник ТИ	3	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-1
47	5	Направа на циментова шпакловка с PVC мрежа	м2	431,50	5 дни	Wed 1.7.20	Sun 5.7.20	Работник ТИ, общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-2
48	6	Направа на фасадна силикатна мазилка по стени и страници	м2	365,50	3 дни	Mon 6.7.20	Wed 8.7.20	Работник ТИ, общ работник	5	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-3
49	7	Направа на цокълна мозаечна мазилка	м2	66,00	1 ден	Thu 9.7.20	Thu 9.7.20	Работник ТИ, общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	миксер-2
50	8	Направа на ламаринена пола с полиестерно покритие с разг 25см	м	12,00	1 ден	Thu 9.7.20	Thu 9.7.20	Тенекеджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т инструменти за ламарина-1
51	9	Боядисване с блажна боя по парапет	м2	15,00	1 ден	Fri 10.7.20	Fri 10.7.20	Бояджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	
52	Д	***Мярка за енергоспестяване"Топлоизолиране на под"***			***13 дни***	***Thu 18.6.20***	***Tue 30.6.20***				бордова кола 1бр
53	1	Ръчен изкоп около сграда	м3	16,00	2 дни	Tue 23.6.20	Wed 24.6.20	общ работник	4	ТР, КБЗ	
54	2	Почистване на основата	м2	20,00	1 ден	Wed 24.6.20	Wed 24.6.20	общ работник	1	ТР, КБЗ	
55	3	Направа на битумна хидроизолация по основи	м2	20,00	1 ден	Thu 25.6.20	Thu 25.6.20	Изолатораджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	газова горелка-1
56	4	Доставка и полагане на топлоизолация XPS 50мм по основи	м2	20,00	1 ден	Fri 26.6.20	Fri 26.6.20	Работник ТИ	1	ТР, КБЗ, ЕКК	перфоратор-1, миксер-1
57	5	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	20,00	1 ден	Sat 27.6.20	Sat 27.6.20	Изолатораджия	1	ТР, КБЗ, ЕКК	апарат за заповаване-1
58	6	Направа на трамбован обратен насип	м3	16,00	2 дни	Sun 28.6.20	Mon 29.6.20	общ работник	4	ТР, КБЗ, ЕКК	Пневматична трамбовка-1
59	7	Подмяна на дървен гредоред	м3	1,00	2 дни	Thu 18.6.20	Fri 19.6.20	Дърводелец, общи работници	3	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-3, циркуляр-1
60	8	Подмяна на дюшеме	м2	10,00	1 ден	Sat 20.6.20	Sat 20.6.20	Дърводелец	2	ТР, КБЗ, ЕКК	винтоверт-1, циркуляр-1
61	9	Направа на армирана бетонова настилка 10см широчина 1м	м2	20,00	1 ден	Tue 30.6.20	Tue 30.6.20	Бетонджии	2	ТР, КБЗ, ЕКК	бетонобъркачка-1
62	Е	***Други***			***30 дни***	***Thu 11.6.20***	***Fri 10.7.20***				
63	1	Почистване на строителни отпадъци	м3	20,00	3 дни	Thu 11.6.20	Fri 10.7.20	общ работник	3	ТР, КБЗ	
64	2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	20,00	3 дни	Fri 12.6.20	Fri 10.7.20	общ работник	3	ТР, КБЗ	Самосвал-1
65	Ж	***ОБОРУДВАНЕ***			***18 дни***	***Thu 25.6.20***	***Sun 12.7.20***			***РСО***	транспортен бус-1бр
66	1	Автономен климатизатор разделен тип, за охлаждане и отопление, термопомпен вариант, инверторен модел, размер 9 - вътрешно тяло за висок стенен монтаж, Qохл. = 1,2 ÷ 2,6 kW; Qот. = 1,5 ÷ 2,8 kW; NЕЛ. = 0,8 kW; 220 V; 50 Hz; комплект с дистанционен контрол	бр	10,00	4 дни	Thu 9.7.20	Sun 12.7.20	Монтажник ОВК	4	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-3, Ø Перфоратор-2бр
67	2	Панелен електрически конвектор за стенен монтаж, 1500W, 230 V	бр	1,00	1 ден	Thu 25.6.20	Thu 25.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за
68	3	Панелен електрически конвектор (влагозащитен) за стенен монтаж, 1000W, 230 V	бр	2,00	1 ден	Thu 25.6.20	Thu 25.6.20	Монтажник ОВК	1	ТР, КБЗ, ЕКК	к-т комплект инструмент за ОВК-1
69	III.	**III. Довършителен етап**			**7 дни**	**Sat 11.7.20**	**Fri 17.7.20**			РСО	
70	1	Довършителни работи и демобилизация			3 дни	Sat 11.7.20	Mon 13.7.20	общ работник	4	РСО, ТР, КБЗ, ЕКК	Бордова кола, самосвал
71	2	Изготвяне на екзекутивна и друга документация за предаване на обекта			4 дни	Mon 13.7.20	Thu 16.7.20			РСО, ТР, ЕКК	
72	3	**Подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа Образец 15**			**1 ден**	**Fri 17.7.20**	**Fri 17.7.20**			РСО	

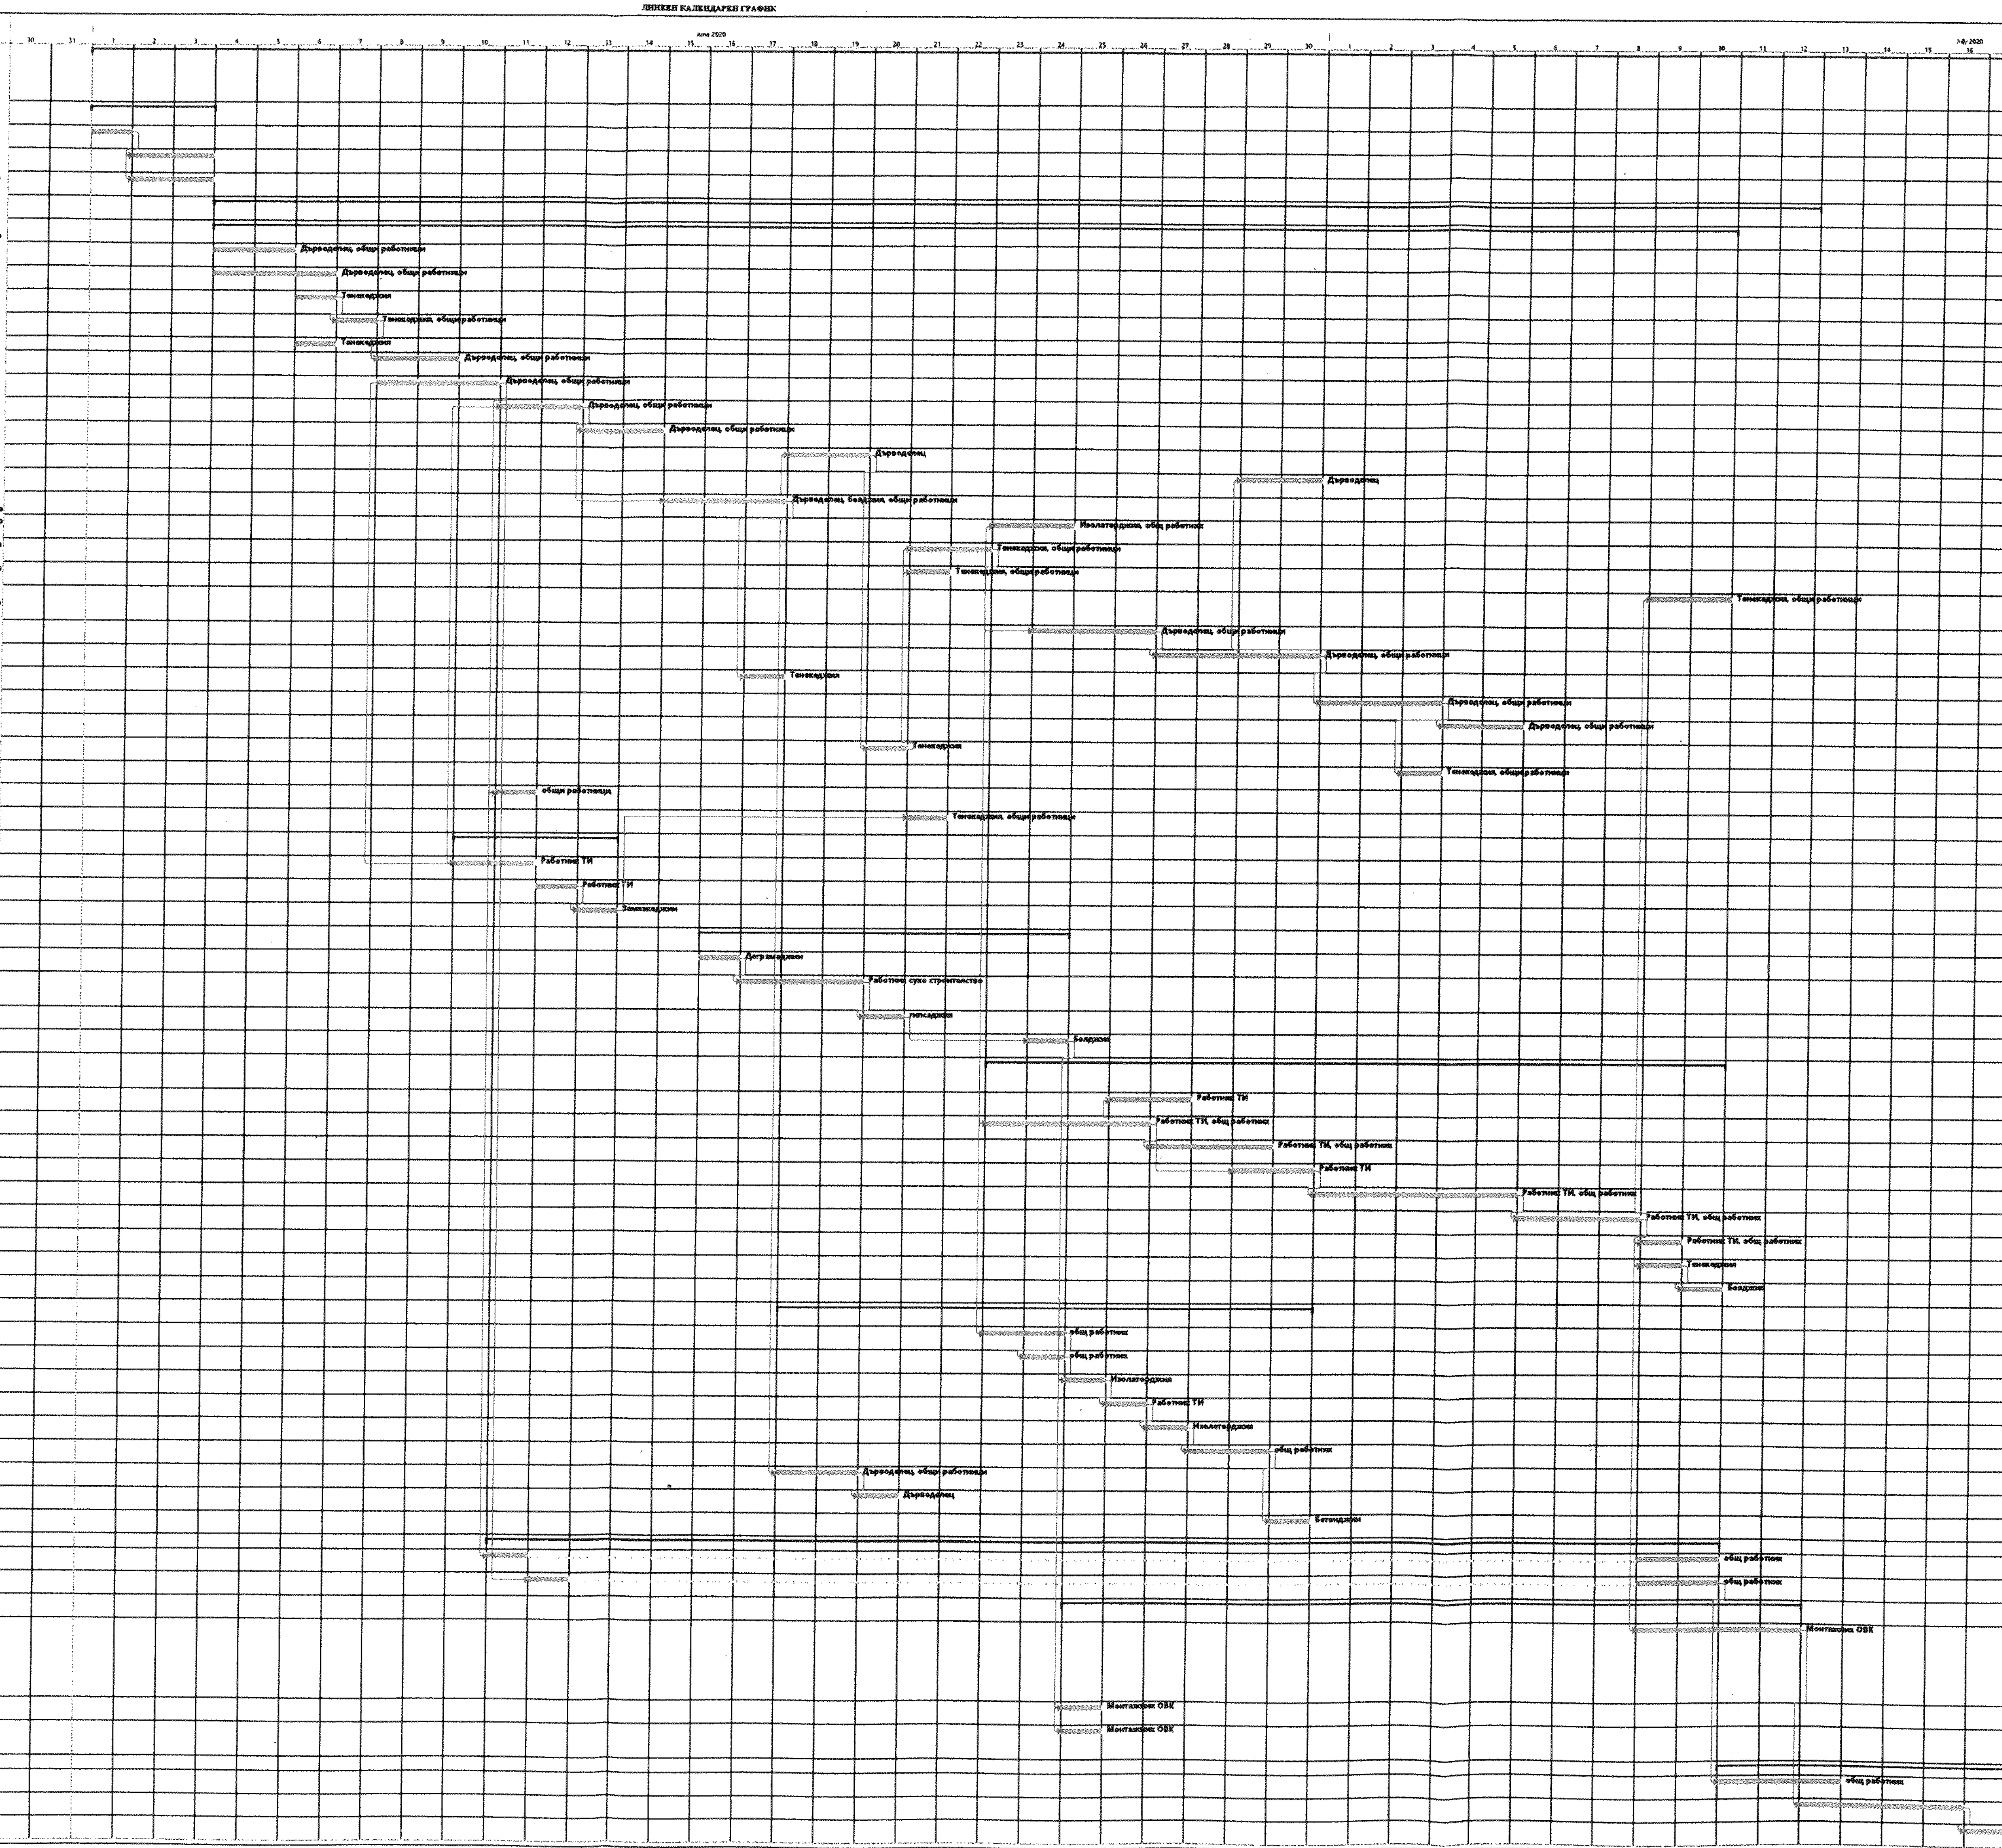

Николай Манчев ....
/Управител на "Хоус Мейдинг" ООД/
